Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě - Petřkovicích

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	podpis SOD	1 den	26.9. 16	26.9. 16
2	příprava stavby	20 dny	27.9. 16	16.10. 16
3	výrobní dokumentace a výroba OK	30 dny	27.9. 16	26.10. 16
4	**celkový průběh stavby**	**327 dny**	**27.9. 16**	**25.8. 17**
5	přejímka staveniště	1 den	27.9. 16	27.9. 16
6	zřízení zařízení staveniště	4 dny	27.9. 16	30.9. 16
7	ochranná opatření zajišťující bezpečný provoz školy	4 dny	27.9. 16	30.9. 16
8	vytýčení stavby	4 dny	30.9. 16	3.10. 16
9	zemní práce pro založení objektu	9 dny	29.9. 16	7.10. 16
10	základy objektu	96 dny	10.10. 16	13.1. 17
11	**M1-zemní práce a základy**	109 dny	27.9. 16	13.1. 17
12	zásypy kolem základů	99 dny	24.10. 16	30.1. 17
13	ležatá kanalizace (dešťová a splašková)	23 dny	20.10. 16	25.3. 17
14	montáž ocelových konstrukcí	58 dny	5.12. 16	31.1. 17
15	hrubé podlahy pod izolace -přístavky	2 dny	26.10. 16	27.10. 16
16	hrubé podlahy pod izolace -tělocvična	2 dny	23.2. 17	24.2. 17
17	izolace proti vlhkosti	8 dny	16.11. 16	31.3. 17
18	demontáže a bourací práce učebna	7 dny	6.3. 17	12.3. 17
19	svislé nosné konstrukce přístavby	10 dny	9.11. 16	18.11. 16
20	zárubní zeď	17 dny	25.5. 17	10.6. 17
21	plynovodní přípojka	12 dny	29.5. 17	9.6. 17
22	venkovní část splaškové kanalizace	53 dny	23.5. 17	14.7. 17
23	**M2-svislé nosné konstrukce OK, zdivo**	127 dny	27.9. 16	31.1. 17
24	montáž prefa stropů	3 dny	23.11. 16	25.11. 16
25	montáž střešního pláště	75 dny	3.12. 16	15.2. 17
26	montáž opláštění a vnějších výplní otvorů	52 dny	10.12. 16	30.1. 17
27	vyzdívky a zateplení soklů	3 dny	8.2. 17	10.2. 17
28	hrubé rozvody instalací	24 dny	23.1. 17	15.2. 17
29	vnitřní omítky stěn	24 dny	15.2. 17	10.3. 17
30	vnější úpravy povrchů	32 dny	30.3. 17	30.4. 17
31	keram.obklady stěn	90 dny	20.2. 17	20.5. 17
32	montáž obkladů stěn v tělocvičně	48 dny	29.5. 17	15.7. 17
33	montáž sportovní podlahy	30 dny	1.7. 17	30.7. 17
34	finální vrstvy podlah - dlažby	23 dny	28.4. 17	20.5. 17
35	kompletace instalací	33 dny	15.5. 17	16.6. 17
36	**Spojovací krček**	45 dny	17.5. 17	30.6. 17
37	OK a opláštění	7 dny	17.5. 17	23.5. 17
38	střecha	15 dny	23.5. 17	6.6. 17
39	podlaha a schody	11 dny	20.6. 17	30.6. 17
40	**Učebna V.V.**	68 dny	9.5. 17	15.7. 17
41	vyzdívky, věnce	12 dny	9.5. 17	20.5. 17
42	strop	4 dny	22.5. 17	25.5. 17
43	vyzdívka atiky, betonáž	8 dny	26.5. 17	2.6. 17
44	střecha	16 dny	15.6. 17	30.6. 17
45	omítky	6 dny	10.7. 17	15.7. 17
46	**M3-zastřešení, opláštění, instalace, úpr.pov.vnitřní**	34 dny	27.3. 17	29.4. 17
47	malby a nátěry	19 dny	22.5. 17	16.6. 17
48	zkoušky a revize instalovaných zařízen , zácvik obsluhyí	28 dny	15.7. 17	15.8. 17
49	montáž vnitřních výplní otvorů, učebna	6 dny	10.7. 17	15.7. 17
50	instalace vnitřního vybavení	28 dny	15.7. 17	15.8. 17
51	spuštění VZT bez vytápění	2 dny	30.5. 17	31.5. 17
52	**M4-vnitřní vybavení**	313 dny	1.10. 16	11.8. 17
53	vnější zpevněné plochy kolem tělocvičny	62 dny	15.5. 17	15.7. 17
54	vnější dlažby kolem tělocvičny	45 dny	1.6. 17	15.7. 17
55	fasáda soc.část, tělocvična	23 dny	29.5. 17	20.6. 17
56	sadové úpravy	27 dny	10.7. 17	7.8. 17
57	závěrečná prohlídka stavby	2 dny	17.8. 17	18.8. 17
58	odstraňování zjištěných vad a nedodělků	5 dny	21.8. 17	25.8. 17
59	přejímací řízení, předání smluvních dokladů	5 dny	14.8. 17	18.8. 17
60	předání stavby	1 den	18.8. 17	18.8. 17
61	**M5-předání díla**	1 den	18.8. 17	18.8. 17
62	vyklizení staveniště	5 dny	21.8. 17	25.8. 17
63	zajištění kolaudačního souhlasu	8 dny	21.8. 17	30.8. 17

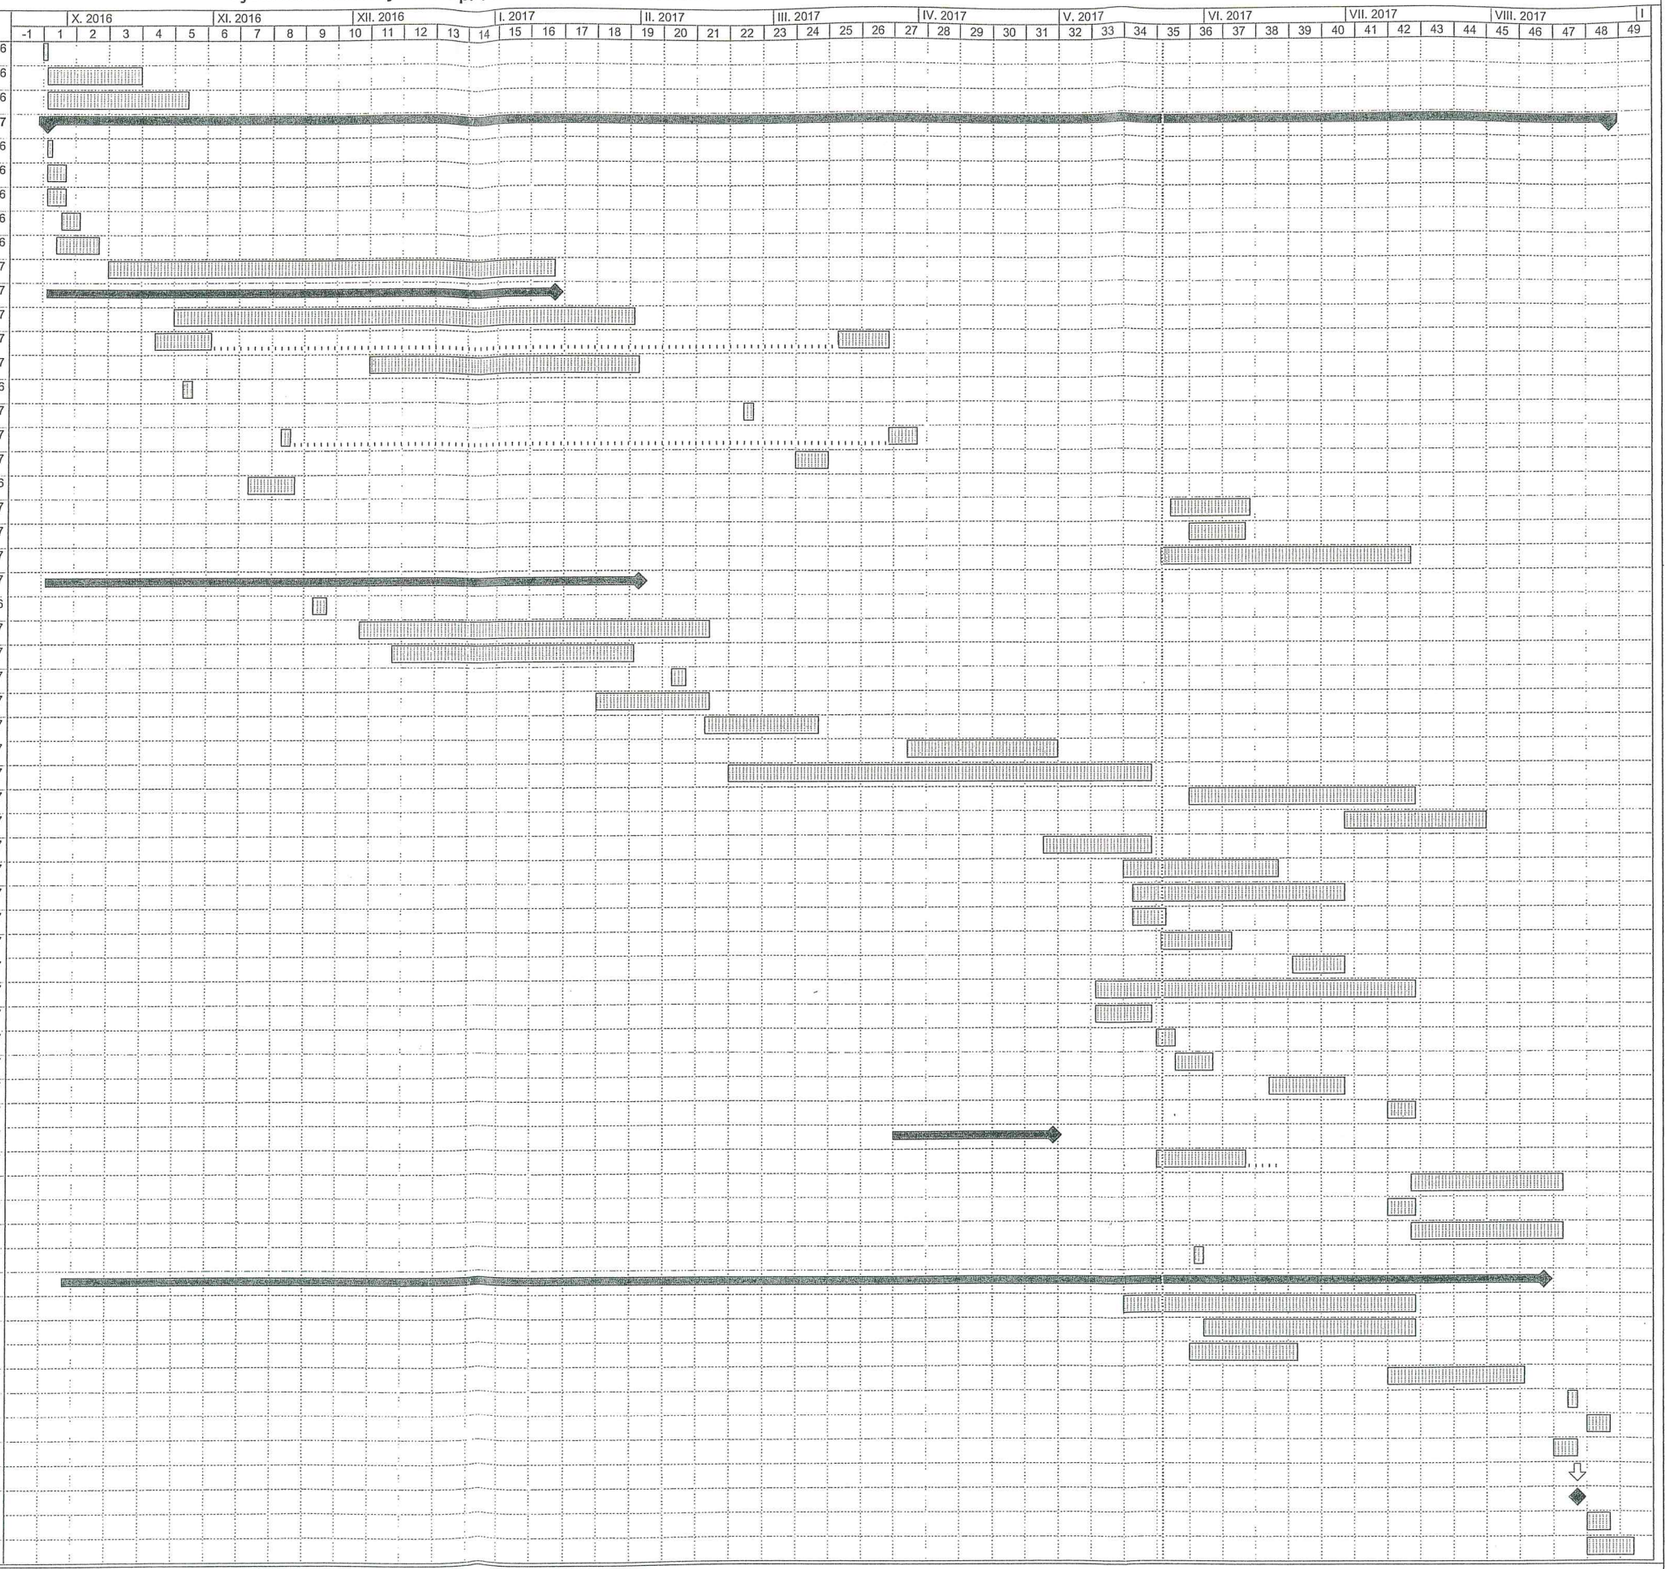

Projekt: 338-16-HMG
Datum: 23.května 2017

Úkol | Rozdělení | Průběh | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín
